Identifikasi Risiko

-Manajemen Risiko Perangkat Lunak-

NISA'UL HAFIDHOH, M.T.

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Proses Manajemen Risiko

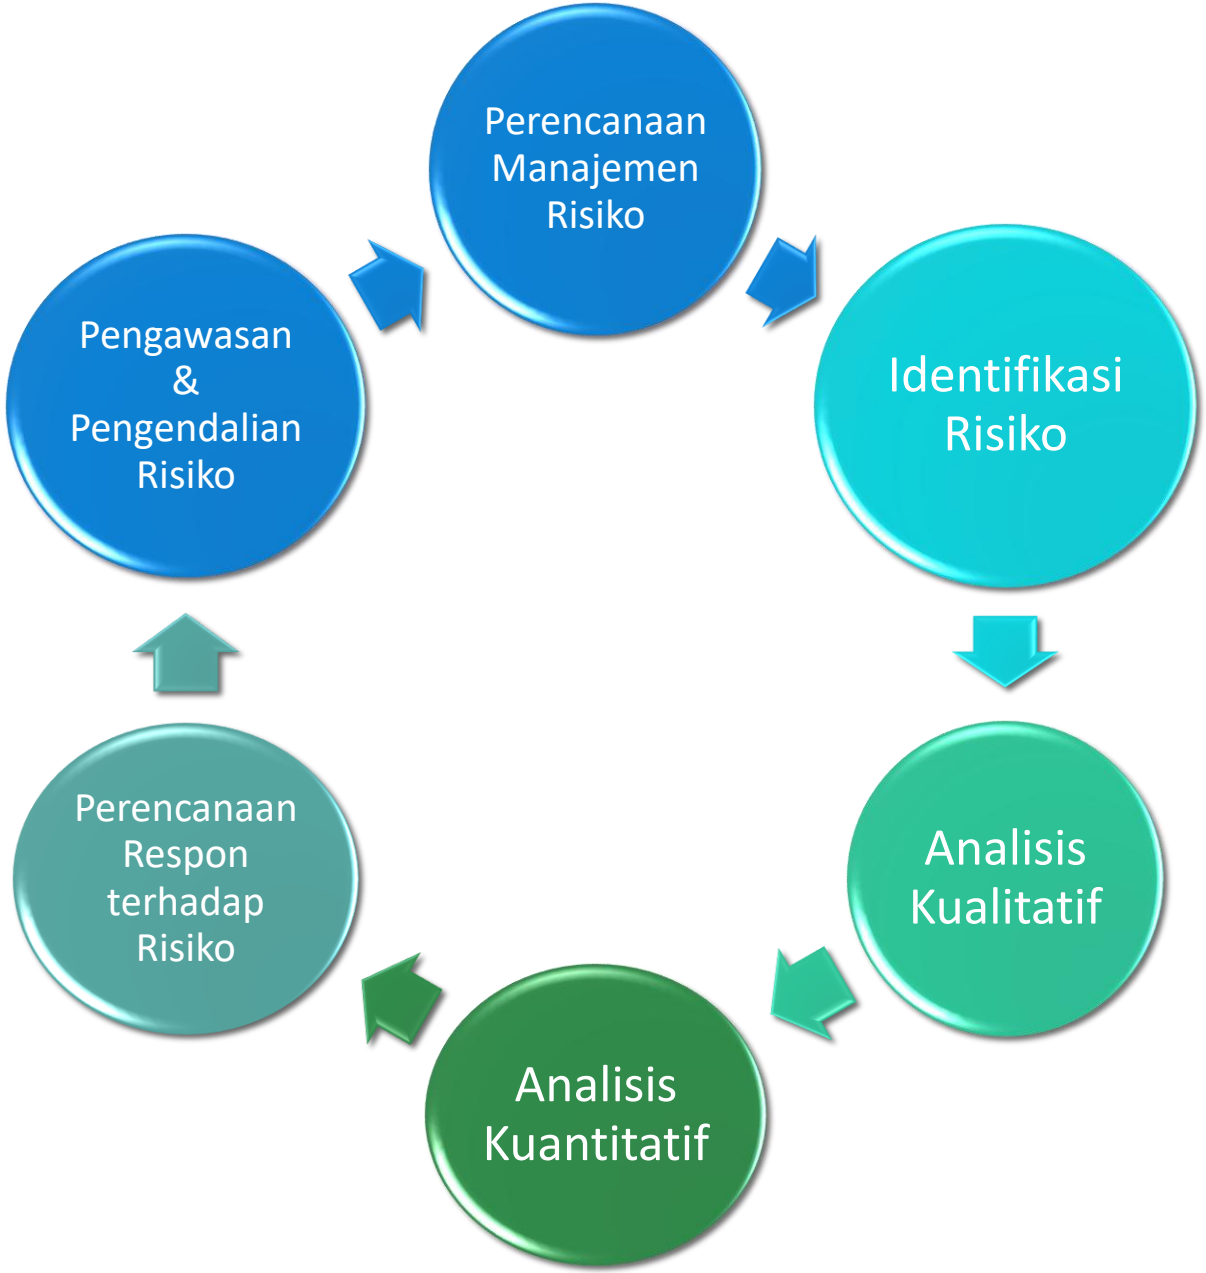

Perencanaan Manajemen Risiko

Proses menentukan pendekatan dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam manajemen risiko.

Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko

Dokumen tertulis memudahkan pengarahan,
sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko.

Perencanaan Manajemen Risiko

Input

- Faktor lingkungan
- Aset proses organisasi
- Pernyataan ruang lingkup proyek
- Rencana manajemen proyek

Proses

- Rencana rapat
- Analisis

Output

- Rencana Manajemen Risiko

Rencana Manajemen Risiko

Visi, misi, tujuan

Peran dan Tanggung jawab

Anggaran Biaya (Terkait aktivitas manajemen risiko)

Metodologi

Identifikasi Pemangku Kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan untuk mendapat informasi dan memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi.

No	Pemangku Kepentingan	Kelompok Pemangku Kepentingan	Hubungan
1	Kementerian PAN RB	Instansi Pemerintah/ eksternal	Penilai dokumen SPBE
2	PT. ABC	Pemasok (vendor) / External	Jasa Pembuat website, Pengelola data center
3	Dinas lain terkait	Instansi Pemerintah/eksternal	Pengelola aplikasi layanan publik
4	Masyarakat	eksternal	Pengguna aplikasi layanan publik
5	Lintasarta, CBN, Telkom	Pemasok (vendor) / External	Penyedia jasa layanan Internet

Anggaran Biaya Manajemen Risiko

Anggaran manajemen risiko dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko.

Anggaran diperlukan untuk penerapan manajemen risiko yang efektif.

Alokasi anggaran manajemen risiko tersebut digunakan untuk kegiatan antara lain:

- Administrasi proses identifikasi risiko dan analisis risiko;
- Penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian/perlakuan risiko;
- Administrasi pemantauan atas proses manajemen risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian/perlakuan risiko;
- Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi;
- Sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi manajemen risiko;
- Evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas manajemen risiko.

Identifikasi Risiko

Input

- Faktor lingkungan
- Aset proses organisasi
- Pernyataan ruang lingkup
- Rencana manajemen proyek
- Rencana manajemen resiko

Proses

- *Documentation review*
- *Teknik pengumpulan informasi*
- Analisis checklist
- Analisis asumsi

Output

- Daftar Risiko

Identifikasi Risiko

Proses menemukan, menguraikan serta mencatat ketidakpastian yang dapat meningkatkan bahkan menghambat kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.

Mendaftarkan risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin dan mendeskripsikan karakteristiknya.

Peserta yang terlibat

1. manajer proyek
2. anggota tim proyek
3. anggota manajemen resiko
4. ahli teknis diluar tim proyek
5. *customer*
6. *end user*
7. ahli manajemen risiko

Merupakan proses iteratif karena resiko-resiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya.

Komponen Risiko

Sumber Risiko : sesuatu yang memiliki potensi kerugian, pemicu timbulnya risiko

Peristiwa : sesuatu kejadian yang mungkin terjadi yang memiliki akibat dan berdampak pada pencapaian tujuan

Dampak : Konsekuensi / akibat dari terjadinya risiko

Penyebab / Faktor Risiko : Penyebab yang langsung dan mendasar dari suatu risiko (apa & mengapa?)

Pengendalian : Langkah antisipasi/pencegahan yang dapat dilakukan

Proses Identifikasi Risiko

Inventarisasi data kejadian atau peristiwa yang mempengaruhi organisasi

Menentukan **sumber** terjadinya risiko

Menentukan area **dampak** risiko

Menentukan **penyebab** dan skenario risiko

Perumusan risiko : Risk register, Kelompok risiko

Teknik Identifikasi Risiko

- Brainstorming
- Observasi dan Survei (kuesioner, inspeksi langsung, dan interaksi dengan unit kerja)
- Wawancara
- Checklist : mengembangkan informasi dari proyek lampau
- Analisis SWOT
- Teknik Delphi (Pendapat Ahli)
- Benchmarking (Pengacuan)

Contoh Risiko

Latihan Memahami Risiko

Fadli adalah manajer proyek Pengembangan Sistem e-Gov. Fadli harus memberikan presentasi mengenai progress proyek di hadapan Walikota Madiun pada hari Senin. Pada hari Minggu ia mengikuti turnamen golf yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi di Ciputra Golf, Surabaya. Malngnya, hari Minggu tersebut cuaca berubah dan hujan turun lebat pada saat dia berada di hole 10. Jika dia terus bermain golf, dia akan basah kuyup dan setelah menyelesaikan sampai hole 18 dapat terkena demam dan sakit flu berat, sehingga hari Senin dia tidak dapat memberikan presentasi di hadapan Walikota Madiun.

Risiko apakah yang terjadi?

Apakah penyebab risikonya?

Apakah peristiwa (*event*) risiko ini?

Apakah dampaknya?

Uraian Risiko

Sumber : Hujan

Sebab: Fadli bermain golf sehari sebelumnya dalam kondisi hujan lebat

Peristiwa: Fadli sakit (demam dan flu), sehingga tidak dapat memberikan presentasi

Dampak: Keterlambatan presentasi proges proyek kepada Walikota Madiun

Risiko Umum pada Proyek PL [1]

Pasar

- Apakah proyek ini menghasilkan produk/ servis yang baru?
- Apakah akan berguna pada organisasi atau dapat dipasarkan kepada yang lain, apakah user akan menggunakan produk?
- Apakah akan ada orang lain yang membuat produk yang sama dengan lebih cepat?

Keuangan

- Apakah organisasi memang mampu membiayai proyek?
- Seberapa yakin stakeholder mau membiayai proyek?
- Apakah proyek akan memenuhi ROI?
- Berapa lama akan sampai pada ROI?
- Apakah proyek ini menggunakan sumber dana dari organisasi dengan cara yang terbaik?

Risiko Umum pada Proyek PL [2]

Teknologi

- Apakah teknologi yang dipilih memang dapat digunakan?
- Apakah akan memanfaatkan teknologi baru atau teknologi yang sudah mapan?
- Apakah hardware, software dan jaringan dapat bekerja dengan baik?

Orang

- Apakah organisasi ini akan memberikan SDM dengan kualifikasi yang tepat?
- Apakah SDM yang terpilih memiliki integritas, memiliki keterampilan manajerial dan teknikal?
- Apakah orang yang berpengalaman?
- Bagaimana relasi antara sponsor dan pelanggan?

Risiko Umum pada Proyek PL [3]

Struktur / Proses

- Seberapa sering akan terjadi perubahan dalam proyek PL?
- Ada berapa kelompok berbeda yang diperlukan dalam menjalankan proyek?
- Ada berapa sistem yang harus dijalankan?
- Apakah organisasi memiliki birokrasi yang dapat menghambat/mempercepat kemajuan jalannya proyek?

Risk Breakdown Structure

Hirarki kategori risiko potensial untuk sebuah proyek

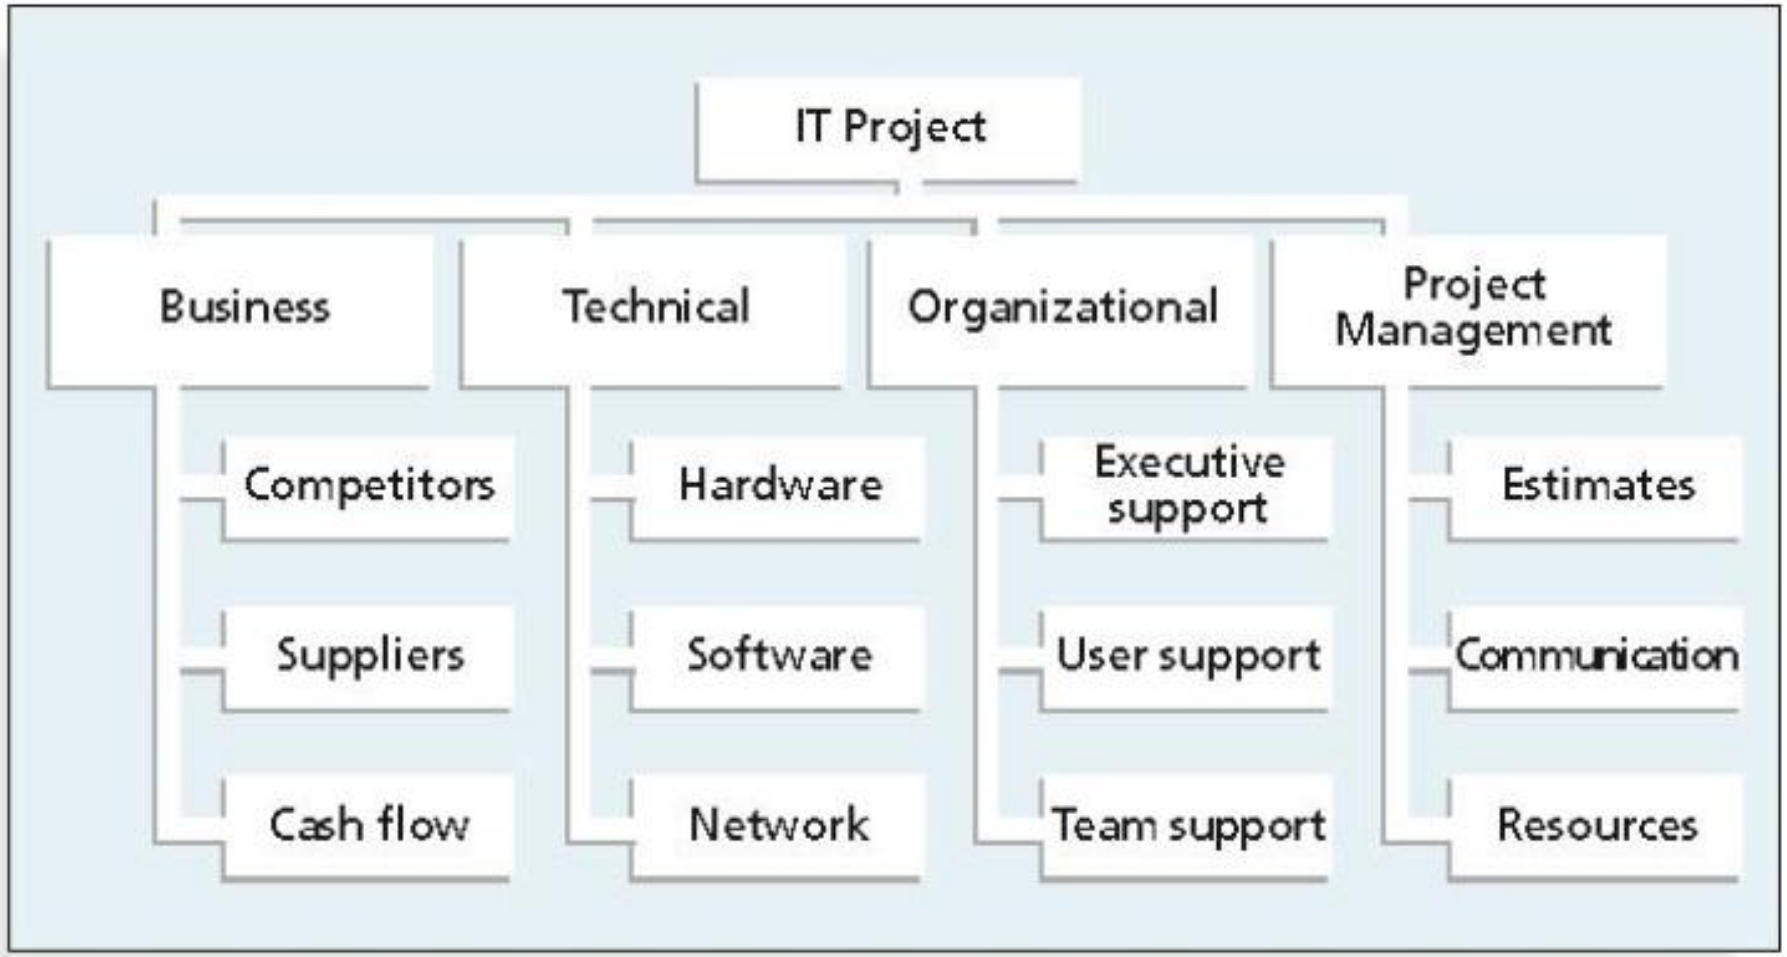

Daftar Risiko

- Nomor identifikasi untuk setiap peristiwa risiko
- Kategori risiko
- Sumber Risiko : Akar masalah munculnya risiko
- Faktor Risiko : Pemicu munculnya risiko
- Deskripsi setiap peristiwa risiko
- Dampak : Pengaruh/akibat pada proyek jika terjadi risiko
- Pemilik Risiko

Contoh Daftar Risiko

Informasi Proyek :

NO	KATEGORI	SUMBER RISIKO	FAKTOR RISIKO	PERISTIWA	DAMPAK	PEMILIK RISIKO

Tugas

Lakukan Identifikasi Risiko dan Buatlah Daftar Risiko sesuai dengan proyek kelompok !
