Penanganan Risiko

-Manajemen Risiko Perangkat Lunak-

NISA'UL HAFIDHOH, M.T.

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Proses Manajemen Risiko

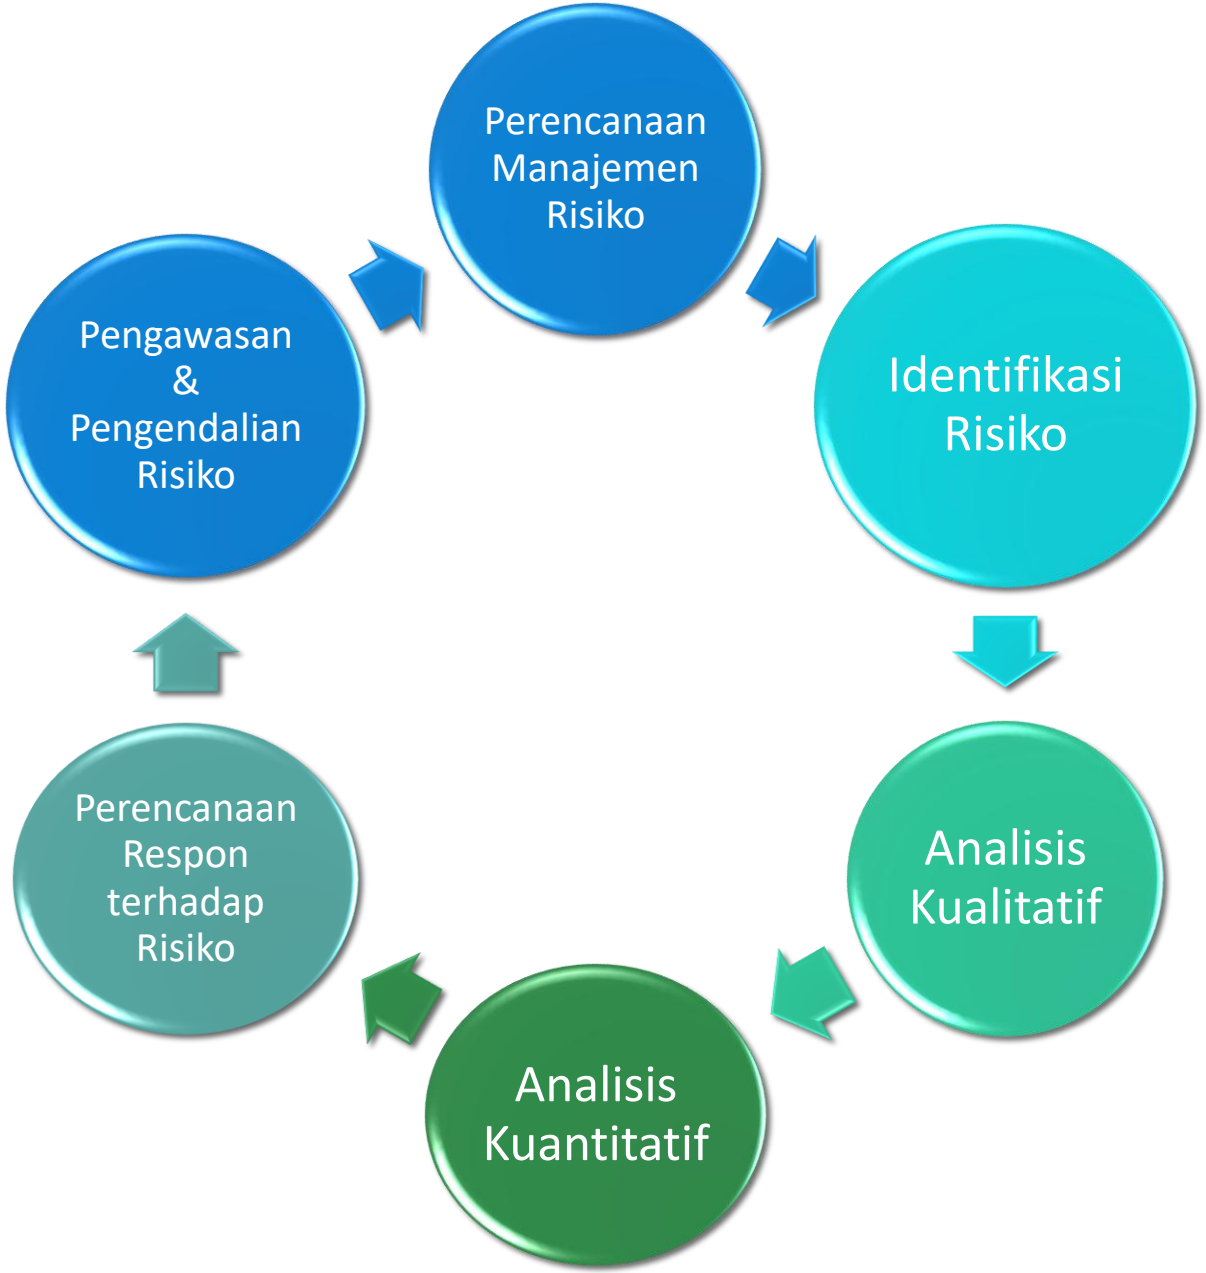

Penanganan risiko

Tindakan Penanganan Risiko adalah bentuk penanggulangan dari masing-masing tingkat risiko yang sudah teridentifikasikan.

Selera Risiko (*Risk Appetite*)

Selera Risiko adalah tingkatan resiko yang bersedia diambil atau diterima oleh sebuah organisasi (instansi) dalam upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Penentuan selera risiko membantu perusahan untuk menetapkan jumlah risiko yang diinginkan dan agar dalam posisi yang nyaman untuk dijalani.

Saat tingkatan resiko sudah ditetapkan maka, resiko di atasnya perlu diselesaikan

Contoh : suatu perusahaan menentukan *risk appetite* ada berada sedang & rendah dengan *risk register* resiko tinggi berjumlah 2 sedang 1 dan rendah 1 maka yang harus diselesaikan disesuikan *risk appetite*

Perencanaan Tindak Penanganan

Proses mengembangkan pilihan dan menentukan tindakan untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek.

Strategi untuk risiko negatif

- **Avoid** : Risk avoidance / penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko yang merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan. Strategi ini memutuskan untuk **tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali**. Apabila dampak sangat besar dan luas dan sulit atau tidak dapat dikendalikan.
- **Transfer** : pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Apabila perusahaan dianggap akan sangat kesulitan dalam mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi baik dampak maupun kemungkinannya. Strategi **memindahkan risiko kepada pihak lain**, umumnya melalui suatu kontrak asuransi maupun hedging.
- **Mitigate** : pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang / batas yang dapat diterima. Strategi **mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko/pun mengurangi dampak kerusakan** yang dihasilkan oleh suatu risiko.

Strategi untuk risiko positif

- **Exploit** : Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan (risiko positif) dapat terealisasi.

  Contoh *:* menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncankan.

- **Share** : Alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Pembagian risiko yang mendistribusikan risiko yang ada ke pihak yang dianggap lebih mampu akan membuat biaya penanganan risiko akan lebih kecil sehingga lebih layak untuk diterima.

  Contoh : *special purposes company, joint venture*

- **Enhance** : Memodifikasi "ukuran" kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif.

  Contoh : Pelatihan

Strategi untuk ancaman dan kesempatan

- **Acceptance** : sangat jarang kemungkinan untuk menghilangkan seluruh risiko proyek. Tim proyek memutuskan tidak mengubah rencana manajemen proyek untuk menyesuaikan dengan risiko.
  - ✓ Penerimaan pasif : tidak ada tindakan
  - ✓ Penerimaan aktif : menetapkan cadangan kontingensi termasuk jumlah waktu, uang, dan sumber daya

Strategi Respon Kontingensi

Beberapa respon dirancang untuk digunakan hanya bila peristiwa tertentu terjadi. Untuk beberapa risiko, tim proyek membuat rencana respon yang hanya akan dilaksanakan di bawah kondisi tertentu

Dana Cadangan / Contingency allowance: Perusahaan menyisihkan dana tertentu secara periodik yang ditujukan untuk membiayai kerugian akibat dari risiko tertentu

Pada hari Ahad tanggal 4 Agustus 2019 terjadi pemadaman listrik di wilayah Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Padamnya aliran listrik disebabkan gangguan pada jalur transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kilovolt (KV) di Jawa Tengah. Akibatnya, pasokan energi dari timur ke barat gagal dialirkan sehingga terjadi gangguan di semua pembangkit listrik di sisi barat Pulau Jawa. Keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus Presiden Republik Indonesia Jokowi mendatangi kantor Pusat PLN dan memberi teguran kepada Jajaran Direksi PT PLN.

Jokowi berujar “Peristiwa pemadaman total Minggu kemarin dan dalam sebuah manajemen besar mestinya ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi dengan manajemen besar harus ada *contingency plan* dan *back up plan*, "Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik. Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, 17 tahun lalu untuk Jawa dan Bali". Menurut Jokowi, kejadian 17 tahun lalu seharusnya bisa dipakai sebuah pelajaran agar tidak terjadi kejadian yang sudah pernah terjadi.

Strategi Penanganan Risiko

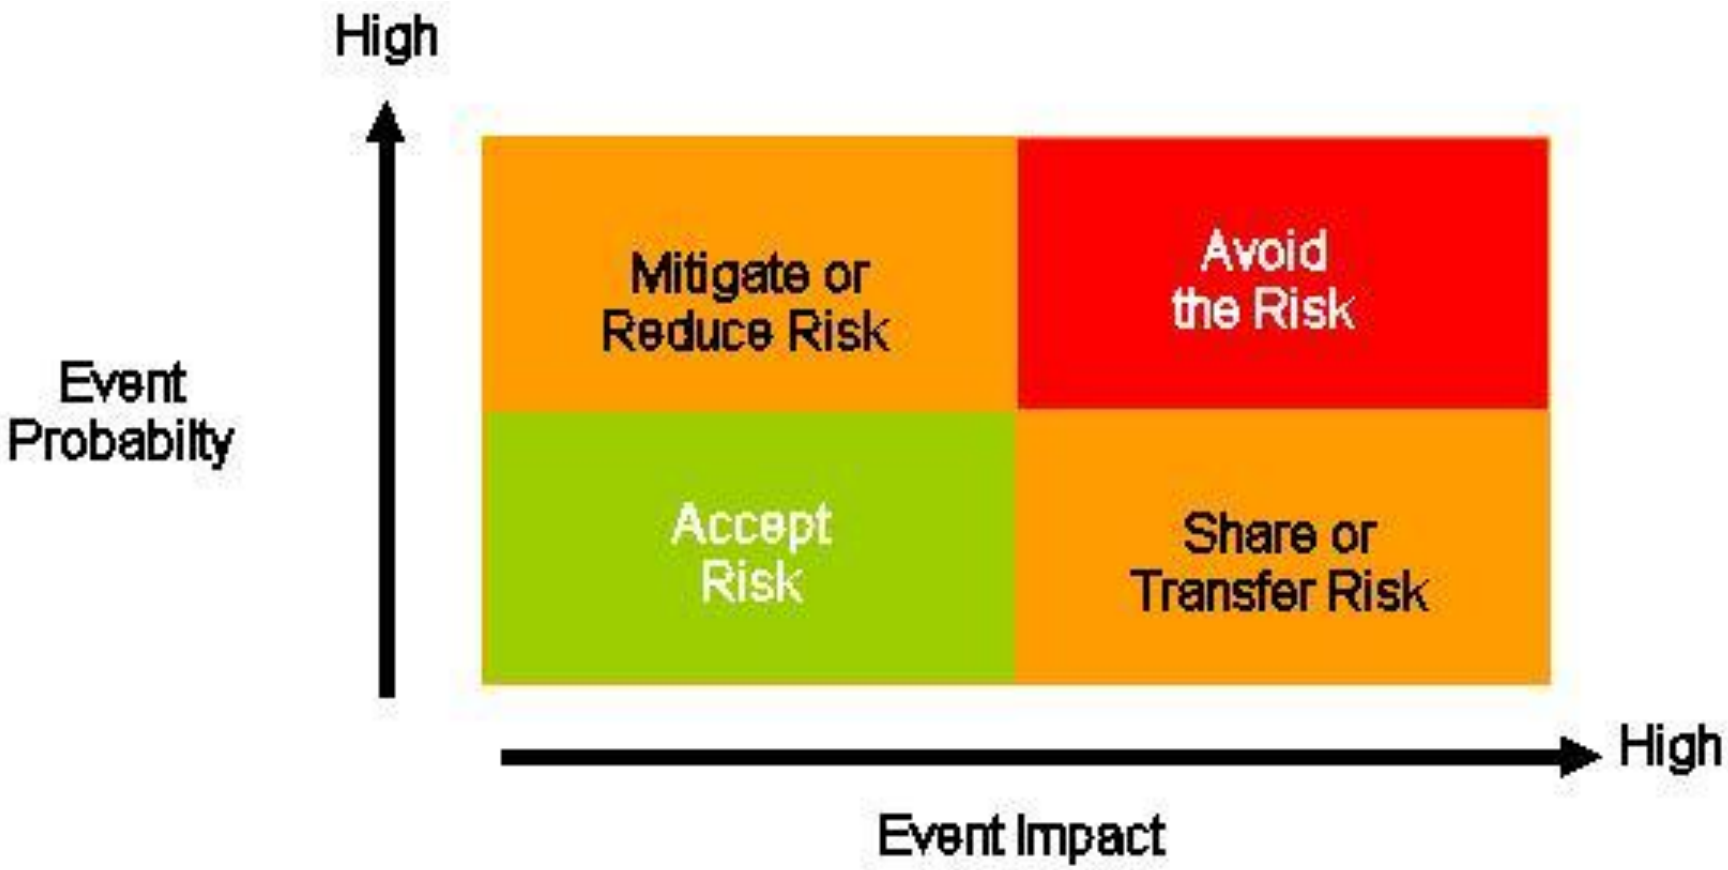

Contoh Strategi Penanganan Risiko

Risiko	Strategi	Penanganan
Server down saat ujian online	Mitigasi	Siapkan backup server dan load balancer
Kebutuhan sering berubah	Transfer/Mitigasi	Gunakan dokumen change request
Pengembang utama resign	Mitigasi	Pair programming, dokumentasi lengkap
